






1 ETAPA

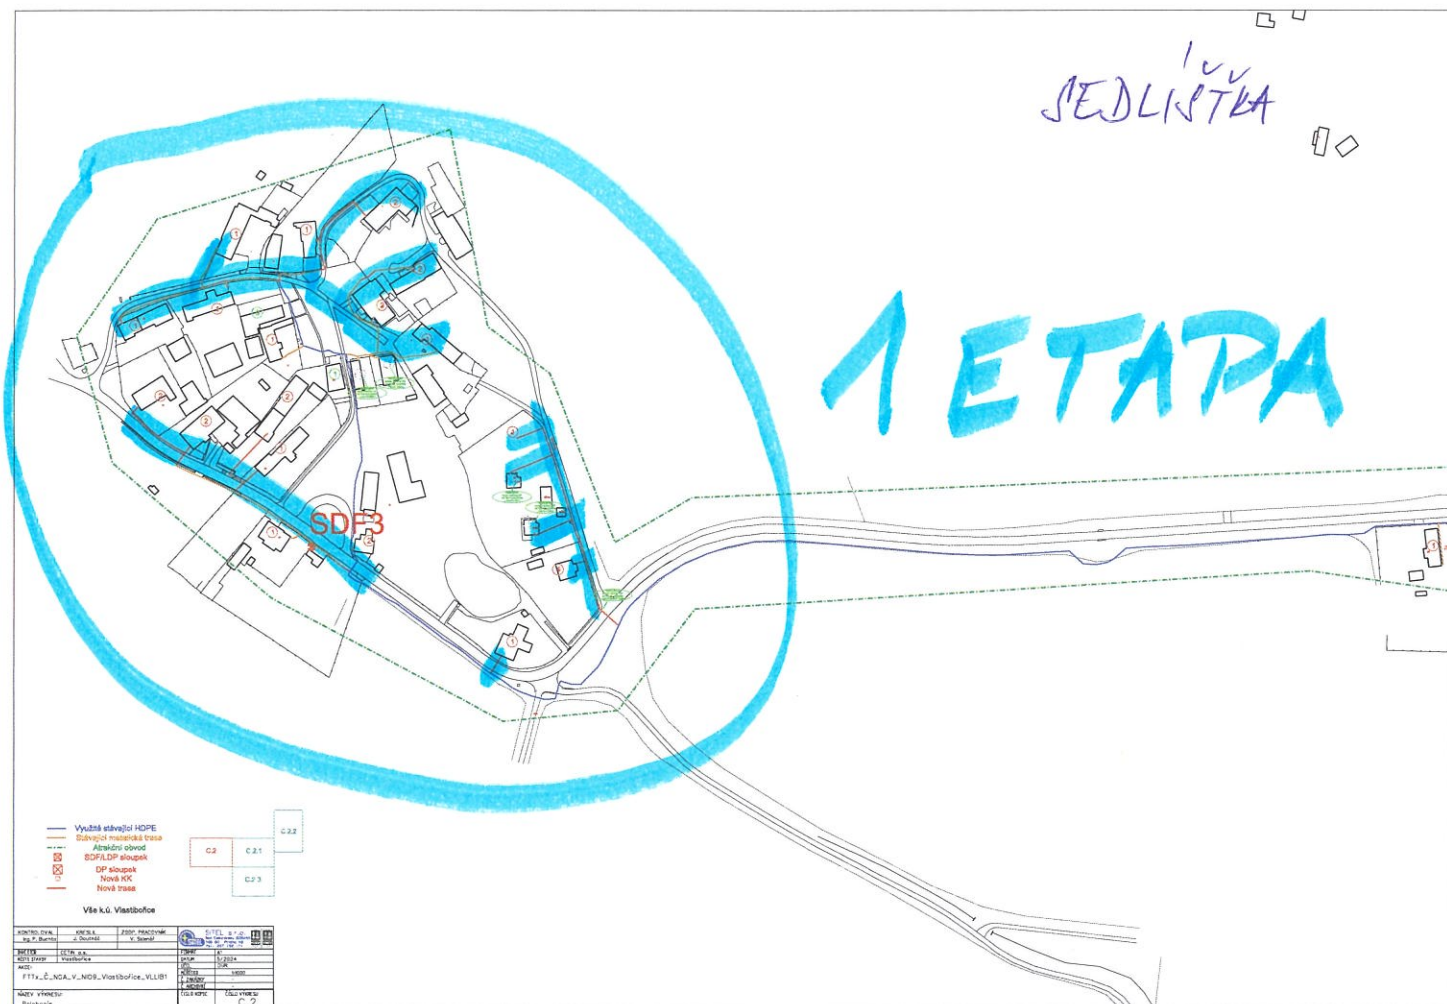

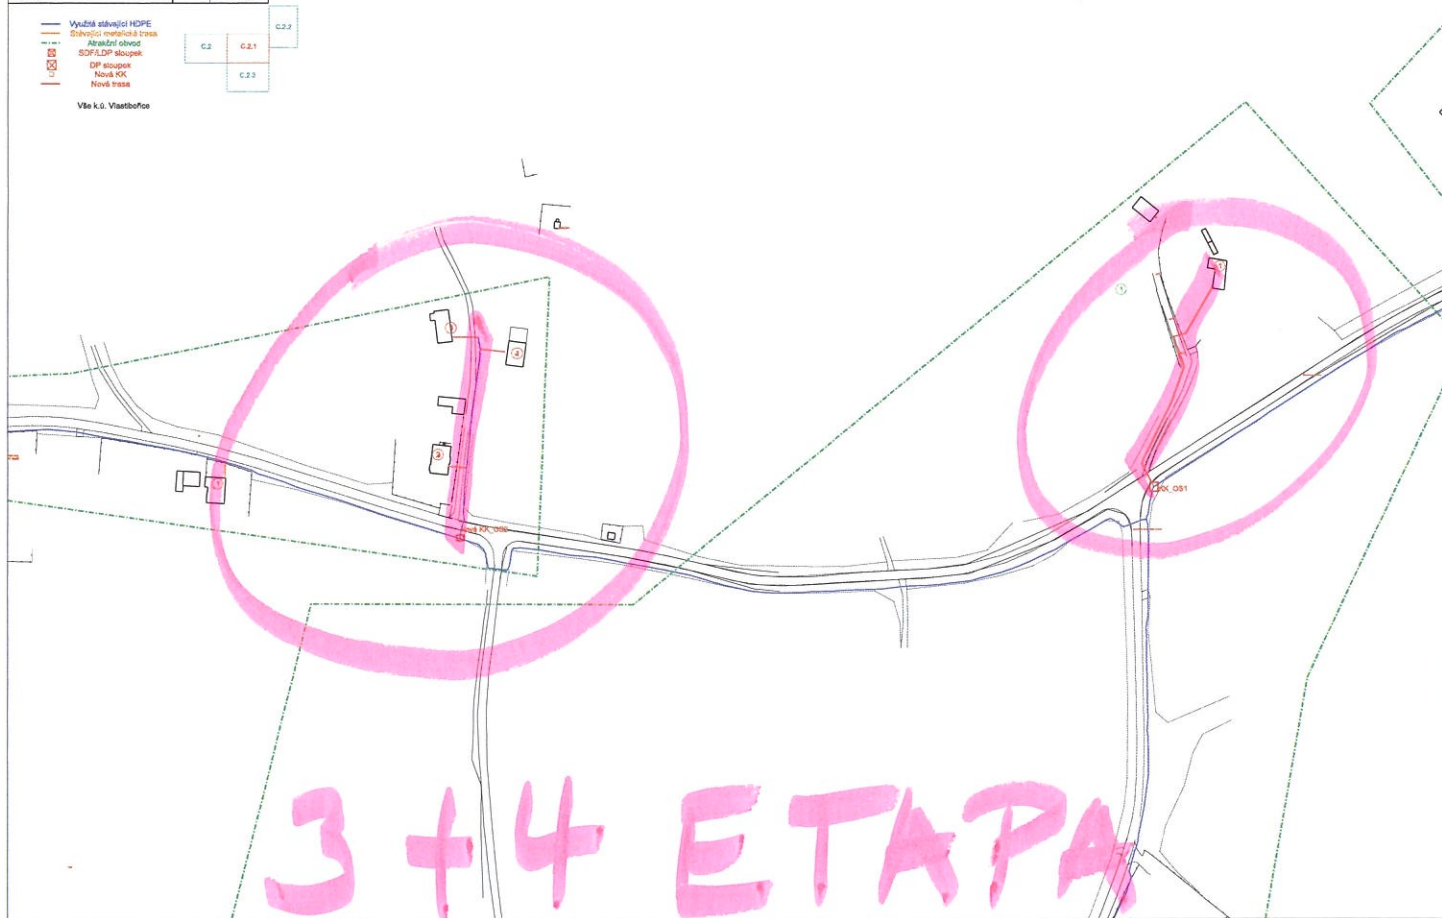

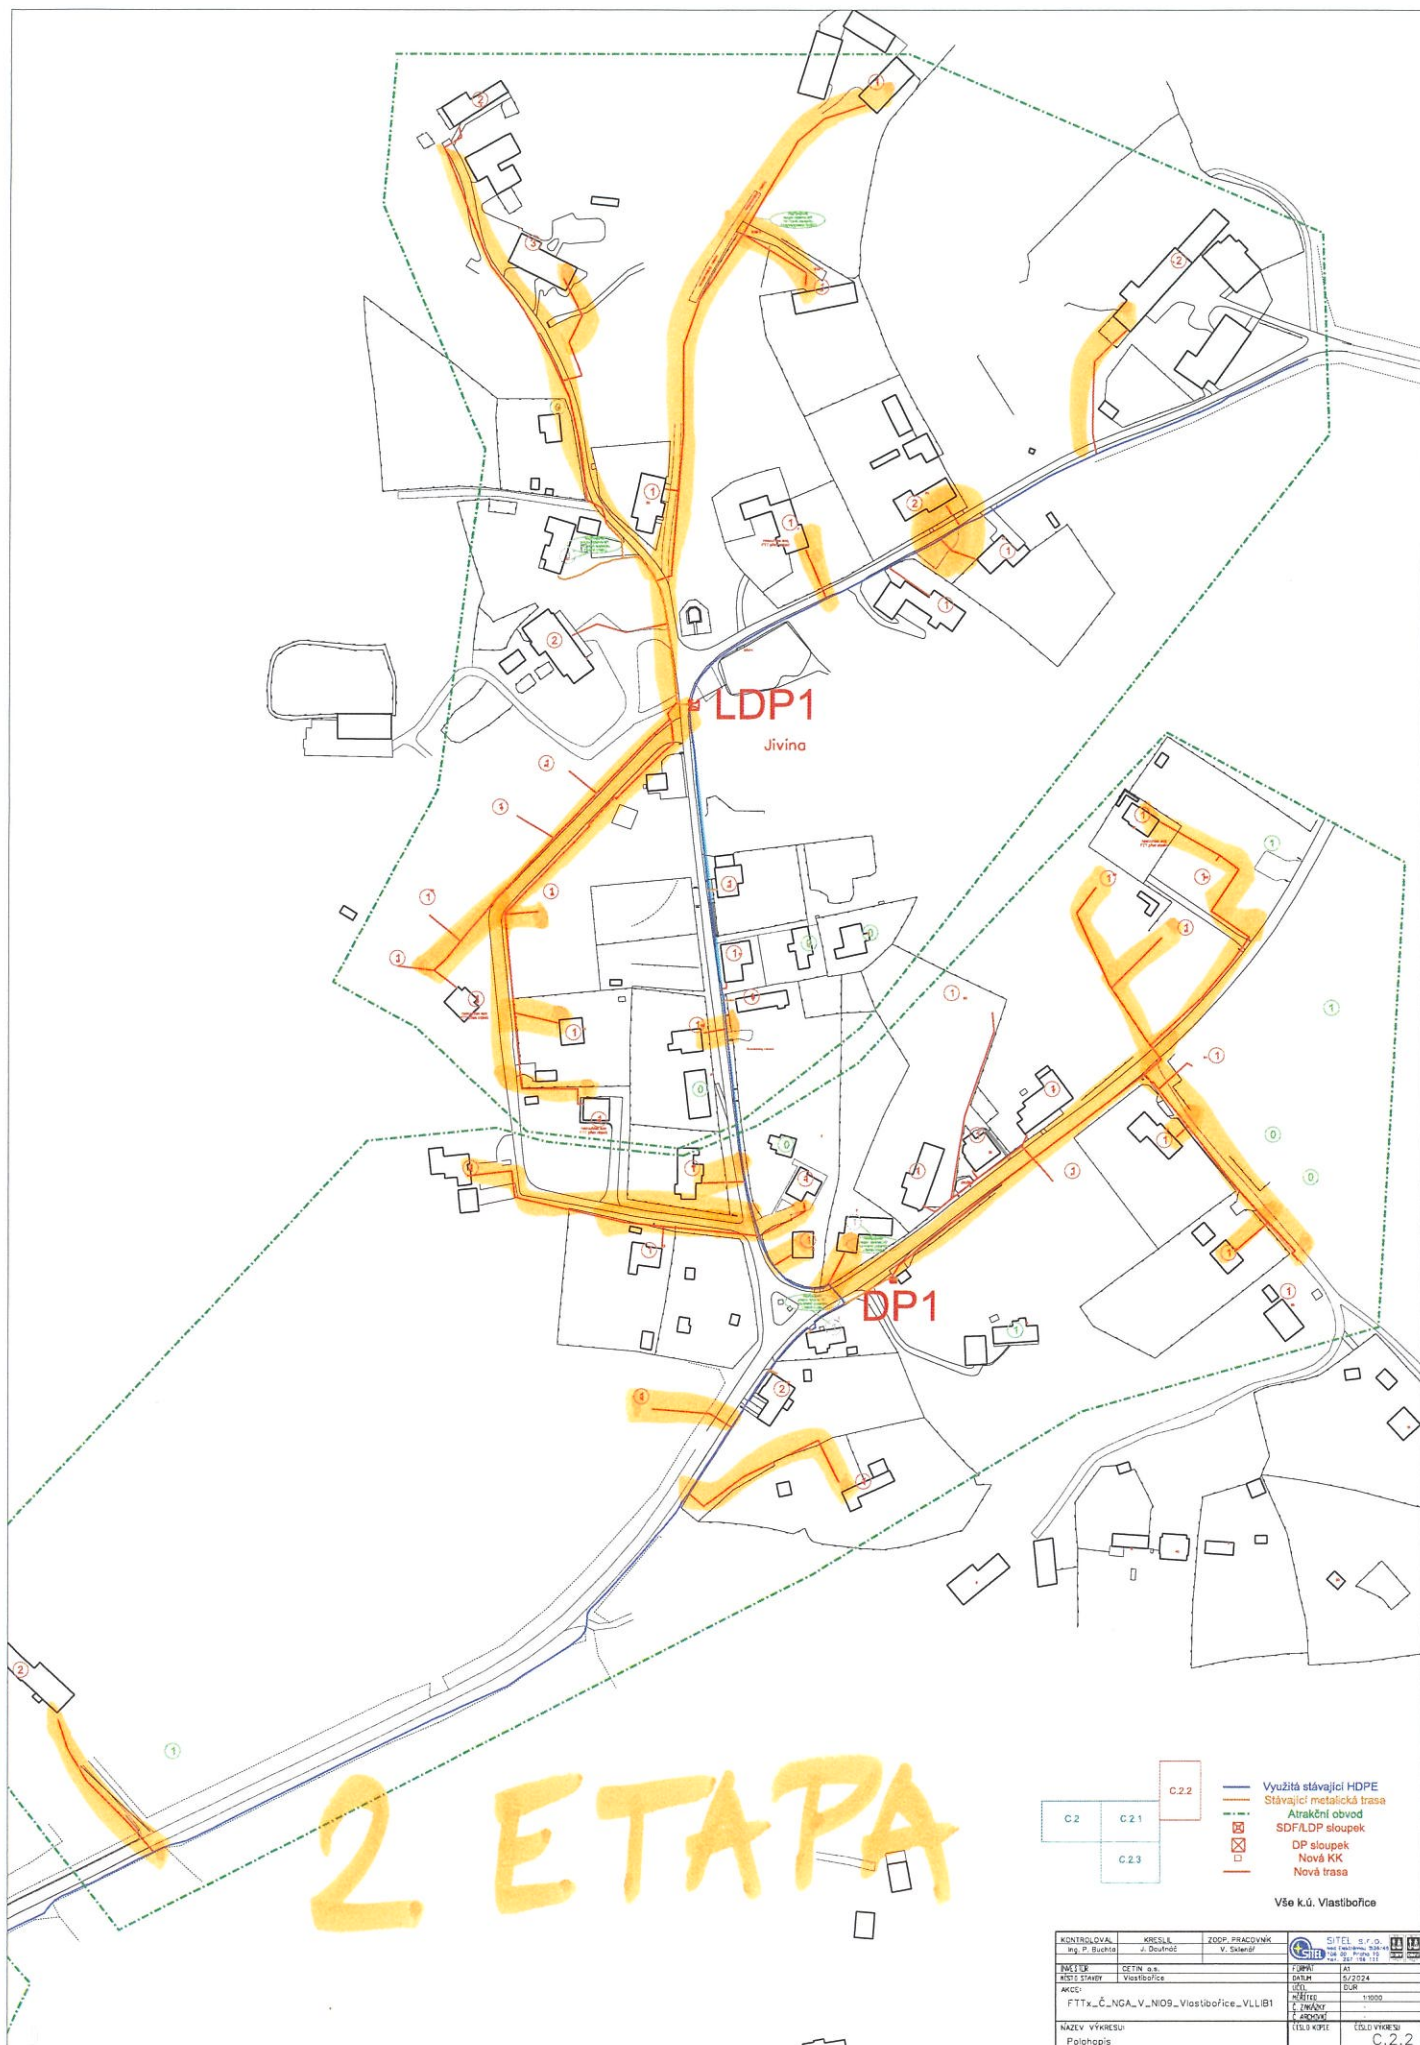

[illegible][illegible]

Akce: FTTx Č NGA V NIO9 Vlastibořice VLLIB1 OK

Prováděcí firma/odpovědná osoba: Telspo s.r.o. – p. Koprnický 731601113

Etapy	Název komunikace	katastrální území	Odhadovaný termín		
			zahájení	ukončení	
1/1	Sedlíštká	Vlastibořice	17.6.	1.7.	začátek výkopů od č.p. 28 směrem k č.p. 30
1/2		Vlastibořice	17.6.	8.7.	Výkop od č.p. 25 směrem k č.p. 9
1/3		Vlastibořice	1.7.	15.7.	střed obce - výkopy u ev.1 a ev.2 směrem k č.p. 10, 11, 15
2/1	Jivina	Vlastibořice	17.6.	8.7.	začátek výkopů od č.p. 46 po ev. 2
2/2		Vlastibořice	24.6.	22.7.	výkop od LDP1 (dětské hřiště) okolo č.p. 60,49,50 až k č.p. 48
2/3		Vlastibořice	8.7.	29.7.	výkop od LDP1 (dětské hřiště) směr slepé ulice až k č.p. 6 a č.p. 7
2/4		Vlastibořice	22.7.	12.8.	Přípojky z hlavní trasy u DP1
3/1	vysílač (Kamenec)	Vlastibořice	21.7.	31.7.	Přípojky z hlavní trasy k č.p. 59, 65, 77
4/1	Heliport	Vlastibořice	13.8.	20.8.	výkop k č.p. 61
5/1	Vlastibořice	Vlastibořice	25.8.	22.9.	začátek výkopů příjezd o Jiviny směrem k SDF2 (obecní úřad) od č.p. 80
5/2		Vlastibořice	25.8.	22.9.	příjezd od Sedlíšky směrem k SDF2 (obecní úřad) výkop od č.p. 66
5/3		Vlastibořice	29.9.	30.10.	výkopy od DP1 (U Zvonice) směr Pěnčín po č.p. 67
5/4		Vlastibořice	29.9.	31.10.	výkop od DP1 (U Zvonice) směr slepé ulice po č.p. 71 a 60, po č.p. 84, po č.p. 28 a 25
Finální úpravy povrchů komunikací			Průběžně	Průběžně	je možné krátkodobé omezení dopravy v rozsahu uvedeném u jednotlivých úseků z důvodu obnovy asfalt. povrchu
	Dokončovací terénní práce úklid			12.12.	Dokončovací práce úklid
